

Indikátorový a evaluační plán 2020 č. 1 – MAS Region Kunětické hory, z.s.

Vzhledem k tomu, že SCLLD byla schválena řídicími orgány se zpožděním až 7/2016 a vyhlášení prvních výzev muselo být posunuto až na 12/2016 dochází již od počátku realizace SCLLD k výraznému posunu v naplňování finančního a indikátorového plánu.

V roce 2016 byly vyhlášeny 2 výzvy z OPZ na celkovou alokaci 2.115.000,-Kč. V rámci těchto výzev byly přijaty 2 projekty, oba v rámci OPZ/O4. V realizaci je jediný, druhý projekt neprošel věcným hodnocením. Pokud bude projekt úspěšně celý proplacen, bude úspěšnost čerpání z těchto výzev z roku 2016 21,6 %.

Na posun v naplňování finančního a indikátorového plánu bylo v roce 2017 reagováno vyhlášením většího počtu výzev (celkem v roce 2017 vyhlášeno 9 výzev) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2017 u PRV: 4.075.000,00 Kč, u OPZ: 4.692.500,00 Kč, u IROP: 14.565.000,-Kč). V rámci těchto výzev bylo přijato 6 projektů, které jsou nyní v různé fázi realizace a udržitelnosti. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost výzev z roku 2017 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 24,2 % (skutečná úspěšnost – projekty byly proplaceny), OPZ, 16,1 %, IROP: 20,6 % (skutečná úspěšnost – projekty byly proplaceny), přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty), PRV/F2 (1 projekt), OPZ/O4 (1 projekt), IROP/O1 (2 projekty).

V roce 2018 bylo navázáno na trend z roku 2017 a byl vyhlášen větší počet výzev (celkem v roce 2018 vyhlášeno 8 výzev) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2018 u PRV: 7.316.000,00 Kč, u OPZ: 4.460.000,00 Kč, u IROP: 24.565.888,83 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 11 projektů, z toho 1 projekt neprošel věcným hodnocením, u 2 projektů byl ukončen administrativní proces na žádost žadatelů, 1 projekt čeká na vydání Rozhodnutí, 7 projektů je nyní v různé fázi realizace a udržitelnosti. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2018 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 20,1 % (skutečná úspěšnost – projekty byly proplaceny), OPZ: 26,9 %, IROP: 34,4 %, přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (3 projekty), PRV/F4 (2 projekty - vyřazeny), PRV/F6 (1 projekt), OPZ/O1 (1 projekt), OPZ/O3 (1 projekt – vyřazen), IROP/O4 (1 projekt), IROP/O5 (2 projekty). Dále byl v tomto roce realizován projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč.

Na začátku roku 2019 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a snížení alokace IROP o 1.913.341,00 Kč z důvodu nuceného přepočtu eura, dále došlo k přesunu alokace mezi opatřeními u OPZ. V roce 2019 bylo vyhlášeno menší množství výzev, protože většina výzev z roku 2018 byla otevřená ještě v roce 2019 (celkem v roce 2019 vyhlášeny 3 výzvy) a na vyšší alokace (celkem alokace výzev v roce 2019 u PRV: 5.349.398,00 Kč, u OPZ: 4.400.723,75 Kč, u IROP: 0,00 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo přijato 6 projektů, z toho 1 projekt neprošel administrativní kontrolou, 3 projekty procházejí ZoZ nebo čekají na vydání Rozhodnutí a 2 projekty mají ukončenou realizaci. Pokud budou tyto projekty úspěšně realizovány a proplaceny, bude úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2019 z hlediska jejich čerpání následující – PRV: 23,1 %, OPZ: 99 %, přičemž největší zájem byl o PRV/F1 (2 projekty – 1 vyřazen), PRV/F6 (1 projekt), OPZ/O1 (2 projekty), OPZ/O3 (1 projekt). Dále byl v tomto roce realizován a ukončen projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč. V roce 2019 proběhla povinná evaluace realizace SCLLD.

Na začátku roku 2020 došlo k rovnání finančního plánu u IROP a PRV a přesunu mezi opatřeními/fichemi, dále došlo k úpravě indikátorů u PRV v důsledku evaluace SCLLD a veřejného projednání. Dosud byly v roce 2020 vyhlášeny 4 výzvy v podstatě na zbytkové alokace (celkem v roce 2020 u PRV: 8.147.284,00 Kč, u OPZ: 0,00 Kč, u IROP: 16.126.637,76 Kč). V rámci vyhlášených výzev bylo dosud přijato 6 projektů, které procházejí hodnocením na MAS. K tomuto datu není možné z důvodu neukončeného hodnocení a neukončeného příjmu u 3 výzev vyhodnotit úspěšnost vyhlášených výzev z roku 2020, přičemž největší zájem byl zatím o PRV/F1 (3 projekty), PRV/F10 (3 projekty). Dále byl v tomto roce proplacen projekt Venkov 21. století z PRV/F9 na dotaci ve výši 306.000,00 Kč.




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Celkové dosavadní čerpání alokovaných peněžních prostředků k 5.6.2020 je následující (projekty jsou očištěné o nerealizované finanční prostředky, nejsou zahrnuty projekty PRV v hodnocení):

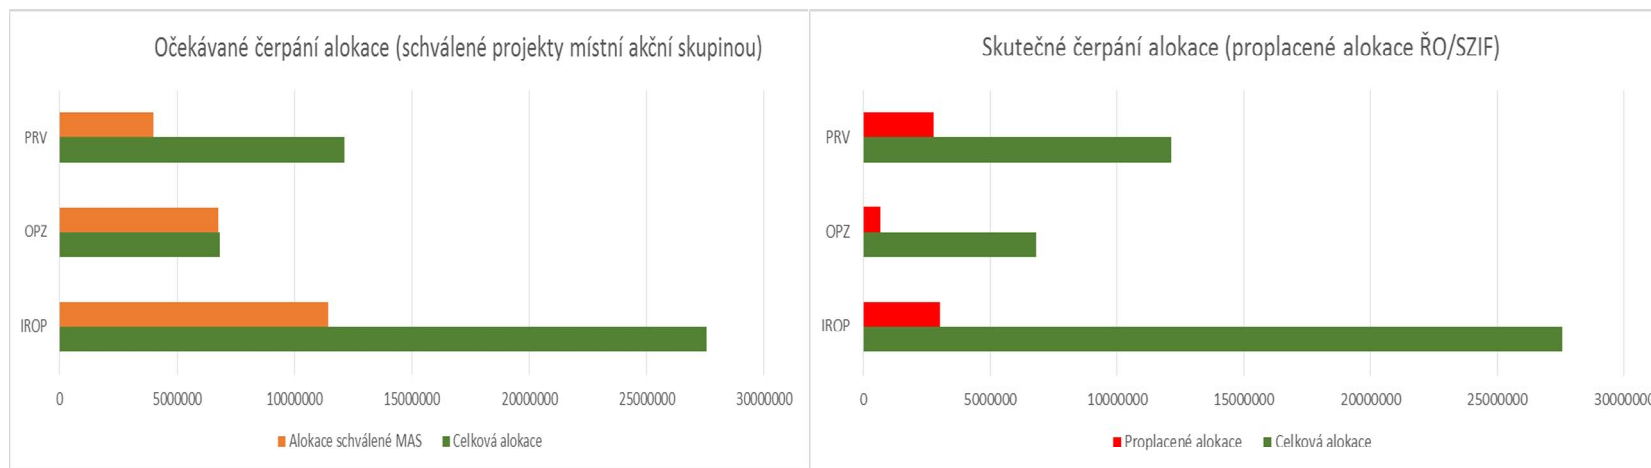

2

Z uvedeného vyplývá, že alokace z OPZ je téměř všechna závazková, čerpání je nyní plně na žadatelích, MAS již nemá právo do čerpání zasahovat. U PRV doporučujeme vyhlásit na zbývající alokaci v příštím roce další výzvu, s tím, že pokud to bude možné, by měly být finanční prostředky přesunuty do fichí, kde se očekávají potenciální žadatelé. U IROP další vyhlášení výzvy závisí na úspěšnosti v současnosti vyhlášených výzev a na přístupu MMR k neplnění limitu 55,44 % čerpání do 31.10.2020. Limit není možné dodržet vzhledem k tomu, že 1 žádost nemá více jak 1 rok vydané Rozhodnutí a v roce 2020 vyhlášené výzvy musely být prodlouženy z důvodu nezaregistrování žádného projektu. I přes to by bylo obtížné limit naplnit, protože proces hodnocení a proces realizace projektu dle zkušenosti manažerky pro SCLLD trvá minimálně rok, spíše dva. Aby kancelář MAS zabránila neplnění limitu, byly již v předminulém roce vyhlášeny výzvy na zbývající alokaci, nebylo však přijato odpovídající množství žádostí.

K naplňování indikátorového plánu dochází po proplacení projektů (PRV), nebo dle data ukončení realizace (MMR) a to vždy do 31.10. daného roku (u milníků do 31.12.2018). Takové projekty jsou zatím evidovány pouze u PRV – 7 projektů k datumu 5.6.2020, dá se předpokládat 9 projektů k 31.10.2020 a u IROP – 2 projekty k datumu 5.6.2020, dá se předpokládat 4 projekty k 31.10.2020. U OPZ se dá předpokládat plnění indikátorů u 1 projektu k 31.10.2020. Naplňování indikátorového plánu nelze urychlit, protože závisí především na době a délce realizace projektů žadatelů/příjemců (u každého projektu individuální), ale i na délce kontroly projektů. Jelikož dochází ke zpoždění finančního plánu, dochází ke zpoždění i indikátorového plánu. Je riziko, že indikátorový plán nebude naplněn v celé výši, jednak kvůli tomu, že musely být zvýšeny alokace na projekty (kvůli zajištění plnění finančního plánu, kvůli vývoji tržních cen) a jednak kvůli nízkému zájmu o některá opatření/fiche. V rámci povinné evaluace byly narovnané indikátory u PRV, na doporučení MMR a MPSV narovnání indikátorů zatím u IROP a OPZ neproběhlo, ale bylo předběžně projednáno, že by narovnání v odůvodněných případech mělo být umožněno. Z toho důvodu při plnění indikátorového plánu dochází k největším potížím u indikátoru 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader), kde má dojít k vytvoření 2 pracovních míst, dosud



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

žadatelé nevytvořily žádné pracovní místo. MAS naplnění tohoto indikátoru podporuje preferenčním kritériem a animací území, k vytvoření pracovního místa ale žadatele nutit nemůže. I kdyby mohla tak u malých projektů, příp. druhu projektů, které byly dosud podpořeny, to není ani vhodné (neúměrný či nesplnitelný závazek pro žadatele). Zpřísnění preferenčních kritérií by zase vedlo k neplnění finančního plánu. K. Holečková projednávala situaci se zástupkyní MZe (L. Chlupáčová), MZe ale v té době nevědělo, jak se k neplnění indikátoru postaví a dosud nebyly podány žádné nové informace. Bylo dáno pouze doporučení zaměřit se na potenciální žadatele mezi začínajícími podnikateli (podnikatel nově zapsaný do rejstříku se bere jako nově vytvořené pracovní místo), o což se kancelář MAS od té doby snaží.

Nejčastější problémy, s kterými se realizace SCLLD potýká:

- zpoždění ve schvalování SCLLD řídicími orgány,
- aktualizace metodik a vzorů řídicími orgány,
- u OPZ a IROP se plnění finančního plánu vykazuje až při čerpání finančních prostředků žadatelem (MAS nemá výraznou šanci ovlivnit),
- indikátory integrovaných projektů se budou vykazovat až po ukončení realizace projektu, příp. po jeho proplacení (MAS nemá výraznou šanci ovlivnit),
- náročná a zdlouhavá administrativa při vyhlášení výzev a kontrole žádostí,
- nižší zájem o výzvy MAS.

Seznam možných příčin nízkého zájmu o výzvy vyplývající z konzultací (informace podány K. Holečkovou – manažerka pro SCLLD): zpoždění realizace SCLLD vedlo k tomu, že žadatelé ztratili o realizaci projektů zájem nebo je realizovali přímo z dotačních programů (dotační programy ŘO jsou velkou konkurencí pro výzvy MAS; až nyní se na MAS obracují žadatelé, které neuspěli ve výzvách vyhlášených ŘO, bohužel projekty jsou většinou na alokace MAS příliš velké); navýšení tržních cen způsobilo, že původní výše plánovaných alokací již není adekvátní tržním cenám; změny/vývoj podmínek, které jsou přísnější, než byly při vzniku SCLLD (žadatelům se za daných podmínek nevyplácí projekt realizovat z dotačních zdrojů, resp. přes výzvy MAS); náročná administrace projektů a složitost pravidel, která žadatele buď přímo odradí, nebo proces přípravy projektů prodlužuje (žadatelé nemají připravené projekty), v roce 2018 se projevil vliv voleb (spousta starostů čekalo na přípravu projektů, až jak dopadnou výsledky voleb).

V následující tabulce předkládáme předpokládané plnění indikátorů na tento rok, který vychází ze změny SCLLD v důsledku povinné evaluace a aktuálního plánovaného harmonogramu výzev (tzn. dle toho jaké výzvy jsou v plánu v roce 2020 vyhlášovat) a konzultací s potenciálními žadateli kanceláří MAS. Plán se zaměřuje na indikátory výstupu, které se MAS zavázala naplnit a indikátor výsledku 94800. Je zřejmé, že reálné plnění indikátorů se bude odvíjet od zájmu žadatelů a dále od připravenosti a kvality projektů, proto i zde doporučujeme flexibilně reagovat na vývoje realizace strategie v rámci možností umožnění řídicími orgány.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Specifický cíl SCLLD	Opatření SCLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů						
		Program	Prioritní osa OP/ Priorita unie	Investiční priorita OP/ Prioritní oblast	Specifický cíl OP/ operace PRV	Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31.12.2018 (je-li ŘO vyžadován)	Očekávaná dosažená hodnota k 31.10.2020	Očekávané závazkování v roce 2020
SC 1.1	IROP/O1	IROP	4	9d	4.1	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	výstup	0	1.1.2014	6	31.12.2023	x	0	0
						75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	realizace	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	x	2	4
						75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	výsledek	30	31.12.2011	35	31.12.2023	x	-	-
						76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	výsledek	7,0	31.12.2011	10,0	31.12.2023	x	-	-
	IROP/O2	IROP	4	9d	4.1	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	objekty	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	1	0	1
						57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	sety	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	x	0	0
						57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	území	výsledek	108	31.12.2014	48	31.12.2023	x	-	-
	IROP/O3	IROP	4	9d	4.1	55301	Počet podpořených bytů pro sociální bydlení	bytové jednotky	výstup	0	1.1.2014	6	31.12.2023	2	0	0
						55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	zařízení	výstup	0	1.1.2014	4	31.12.2023	x	0	2
						55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	služby	výstup	0	1.1.2014	2	31.12.2023	x	0	1
						55310	Nárůst kapacity sociálních bytů	klienti	výsledek	142	20.5.2016	151	31.12.2023	x	-	-
						55320	Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení	osoby/rok	výsledek	113,6	20.5.2016	120,8	31.12.2023	x	-	-



						67510	Kapacita služeb a sociální práce	klienti	výsledek	27	20.5.2016	43	31.12.2023	x	-	-
	OPZ/O2	OPZ	2	2.3	2.3.1	67001	Kapacita podpořených služeb	místa	výstup	0	22.12.2015	4	31.12.2023	x	0	0
						60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	1.6.2016	14	31.12.2023	x	0	0
						67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.6.2016	9	31.12.2023	x	-	-
						67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	osoby	výsledek	0	1.6.2016	9	31.12.2023	x	-	-
						67010	Využívání podpořených služeb	osoby	výsledek	0	22.12.2015	9	31.12.2023	x	-	-
	OPZ/O4	OPZ	2	2.3	2.3.1	60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	22.12.2015	15	31.12.2023	x	45	165
						50001	Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.6.2016	10	31.12.2023	x	15	65
						62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.6.2016	2	31.12.2023	x	-	-
						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	1	31.12.2023	x	-	-
						62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu hledání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	1	31.12.2023	x	-	-
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	2	31.12.2023	x	-	-
SC 1.3	PRV/F9	PRV	6	6B	19.3.1	92501	Celkové veřejné výdaje	EUR	výstup	0	1.1.2014	11313,22	31.12.2022	x	11313,22	11313,22
SC 2.1	PRV/F1	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	8	31.12.2022	2	6	9
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0



	PRV/F2	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2022	1	1	1	
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	1	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F3	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						94302	Celková délka lesních cest	km	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F4	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	4	31.12.2022	0	0	0	
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F5	PRV	6	6B	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F7	PRV	6	6B	19.2.1	93102	Počet podpořených kooperačních činností	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	PRV/F8	PRV	6	6B	19.2.1	93102	Počet podpořených kooperačních činností	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						93701	Počet podpořených podniků/příjemců.	počet	výstup	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	0	31.12.2022	0	0	0	
	SC 2.2	PRV/F6	PRV	6	6B	19.2.1	92702	Počet podpořených operací (akcí)	počet	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2022	0	2	2
							93001	Celková plocha	ha	výstup	0	1.1.2014	22,2	31.12.2022	0	21,8	21,8
SC 2.3	IROP/O4	IROP	4	9d	4.1	10000	Počet podniků pobírajících podporu	podniky	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	1	0	1	



						10102	Počet podniků pobírajících granty	podniky	výstup	0	1.1.2014	3	31.12.2023	x	0	1
						10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	FTE	výstup	0	1.1.2014	6,75	31.12.2023	x	0	2,2
						10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	podniky	výstup	0	1.1.2014	2	31.12.2023	x	0	0
						10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	EUR	výstup	0	1.1.2014	4909,09	31.12.2023	x	0	?
						10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	FTE	výstup	0	1.1.2014	2,03	31.12.2023	x	0	1,2
						10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	%	výsledek	28,5	31.12.2012	22	31.12.2023	x	-	-
	OPZ/O1	OPZ	2	2.3	2.3.1	60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	22.12.2015	20	31.12.2023	x	0	20
						50130	Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce	osoby	výsledek	0	1.6.2016	5	31.12.2023	x	-	-
						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	2	31.12.2023	x	-	-
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	5	31.12.2023	x	-	-
						63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	3	31.12.2023	x	-	-
						63100	Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	-	-
						62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	-	-



	OPZ/O3	OPZ	2	2.3	2.3.1	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	organizace	výstup	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	0	1
						60000	Celkový počet účastníků	osoby	výstup	0	22.12.2015	4	31.12.2023	x	0	3
						10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	organizace	výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	x	-	-
						62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.6.2016	4	31.12.2023	x	-	-
						62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti	osoby	výsledek	0	1.6.2016	2	31.12.2023	x	-	-
						62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	4	31.12.2023	x	-	-
						62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	osoby	výsledek	0	1.6.2016	3	31.12.2023	x	-	-
SC 3.1	IROP/O5	IROP	4	9d	4.1	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	zařízení	výstup	0	1.1.2014	13	31.12.2023	4	2	2
						50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	osoby	výstup	0	1.1.2014	150	31.12.2023	x	156	156
						50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	výsledek	5,4	31.12.2013	5,0	31.12.2023	x	-	-
						50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	výsledek	77,3	31.12.2013	90,5	31.12.2023	x	-	-
	PRV/F10	PRV	6	6B	19.2.1	92702	Počet podpořených operací (akcí)	počet	výstup	0	1.1.2014	4	31.12.2022	x	0	3
						94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	pracovní místa	výsledek	0	1.1.2014	1	31.12.2022	x	0	0

